



GALLIO &
ZACANTE
ENGENHARIA



OBRA RESIDENCIAL DE ALTO PADRÃO

RELATÓRIO SEMANAL
30/09/2025




OBRA RESIDENCIAL DE ALTO PADRÃO

PLANEJAMENTO
30/09/2025

PREVISTO X REALIZADO (CURVA S)

Fechamento 30/09
Previsto: 4,60%
Realizado: 4,98%
Desvio: 0,38%

CURVA DE EVOLUÇÃO FÍSICA (CURVA S)

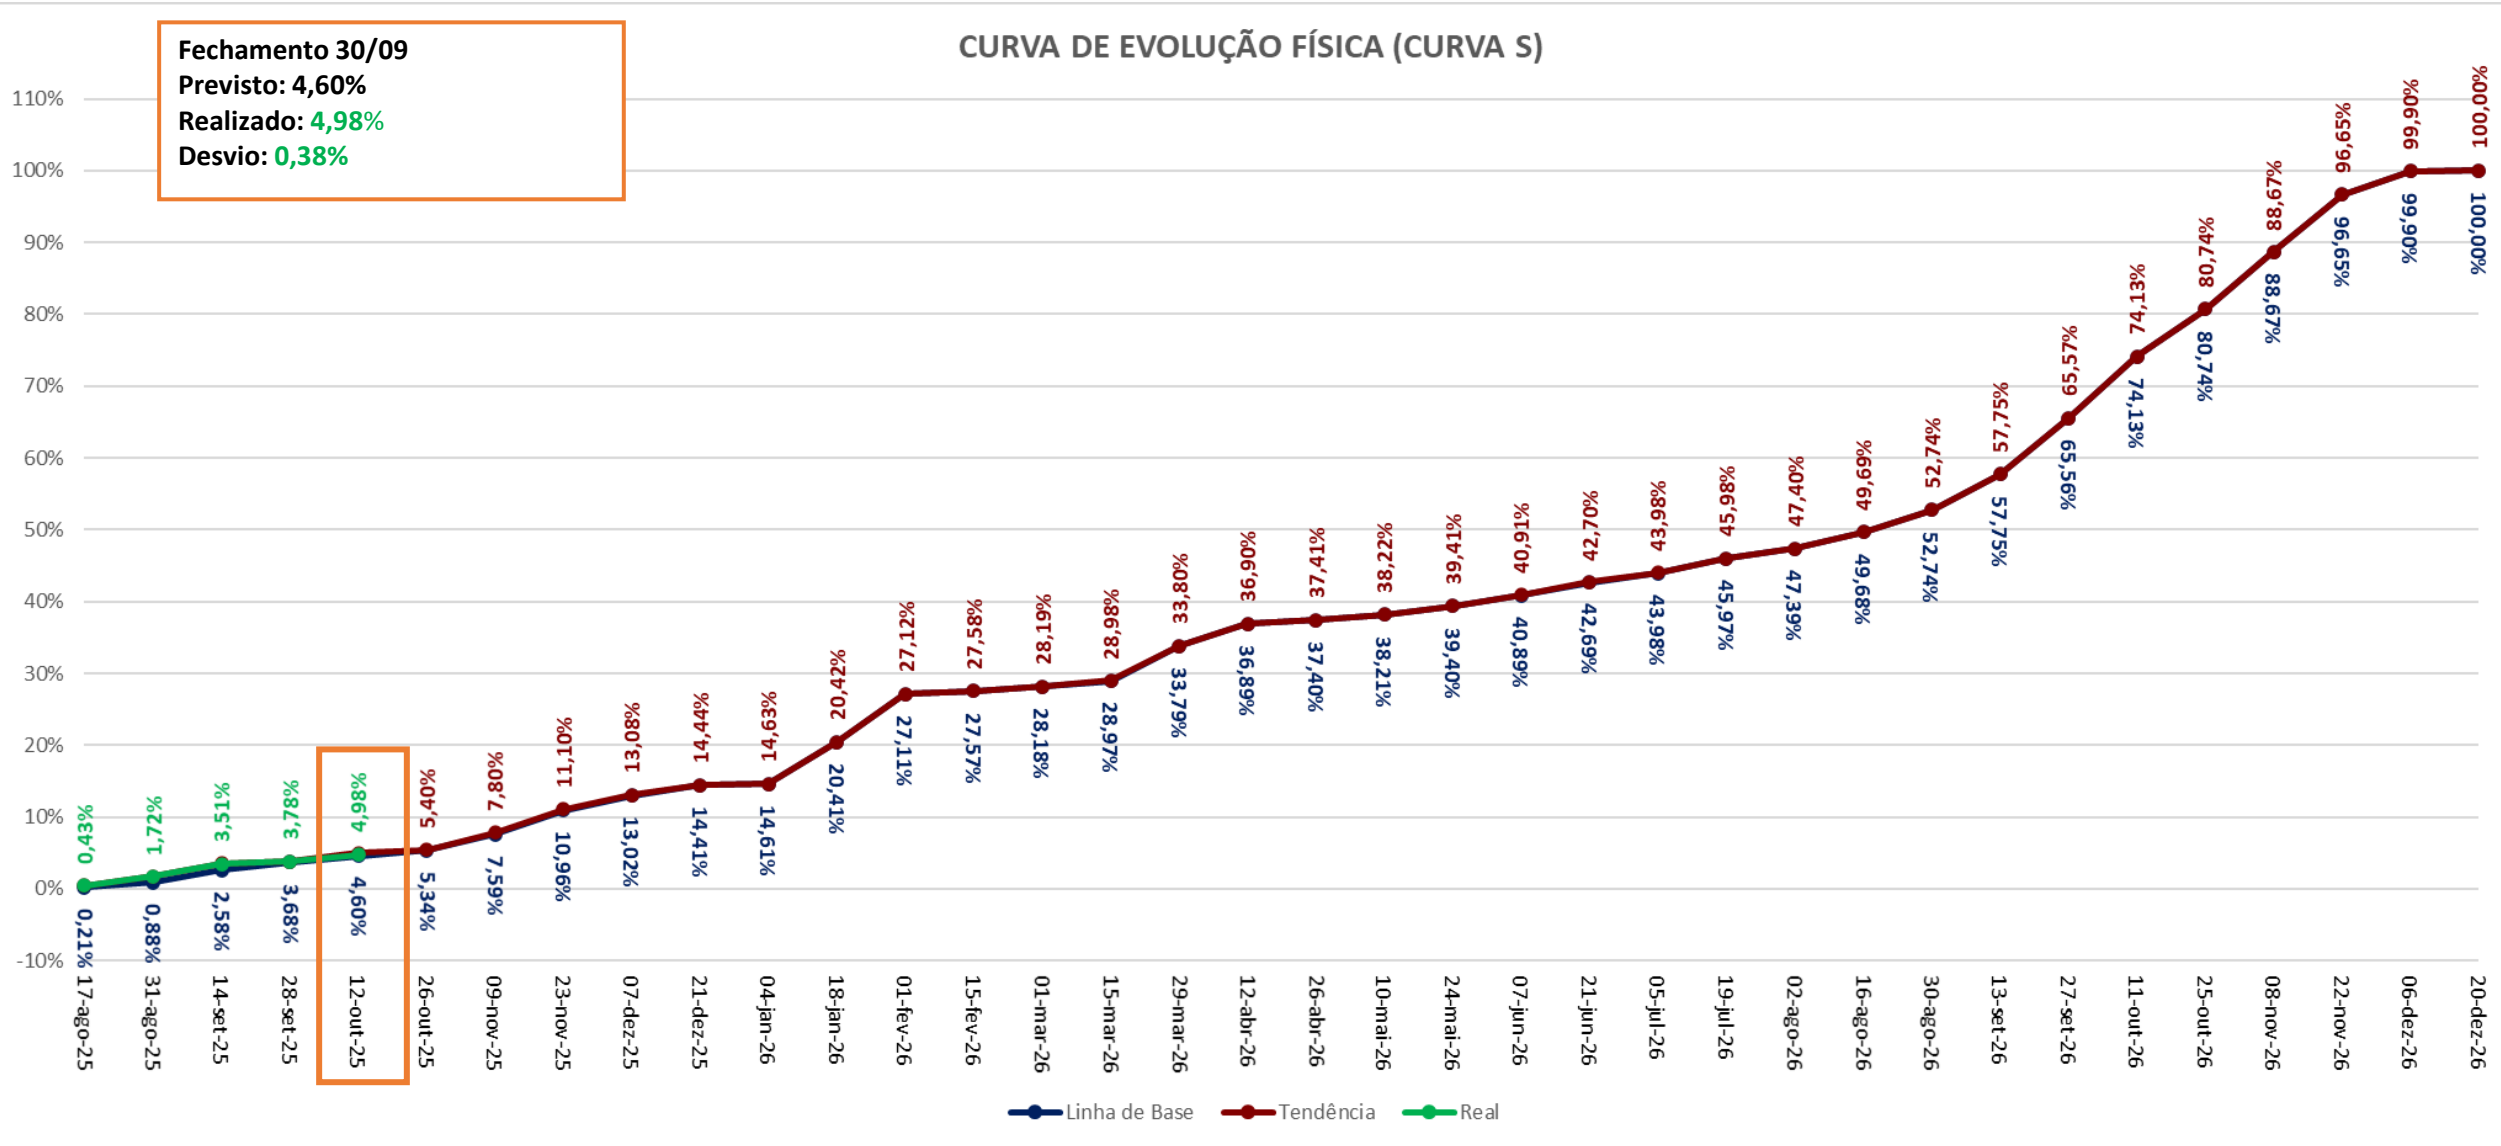



OBRA RESIDENCIAL DE ALTO PADRÃO

CONTROLE VISUAL
30/09/2025


CONTROLE VISUAL – ESTACAS

Pilares: 116 Estacas
A executar : **0 Pilares**
Executados : **116 metros linear**

Atualizado em 30/09

LEGENDA

- À executar
- Em execução
- Executado

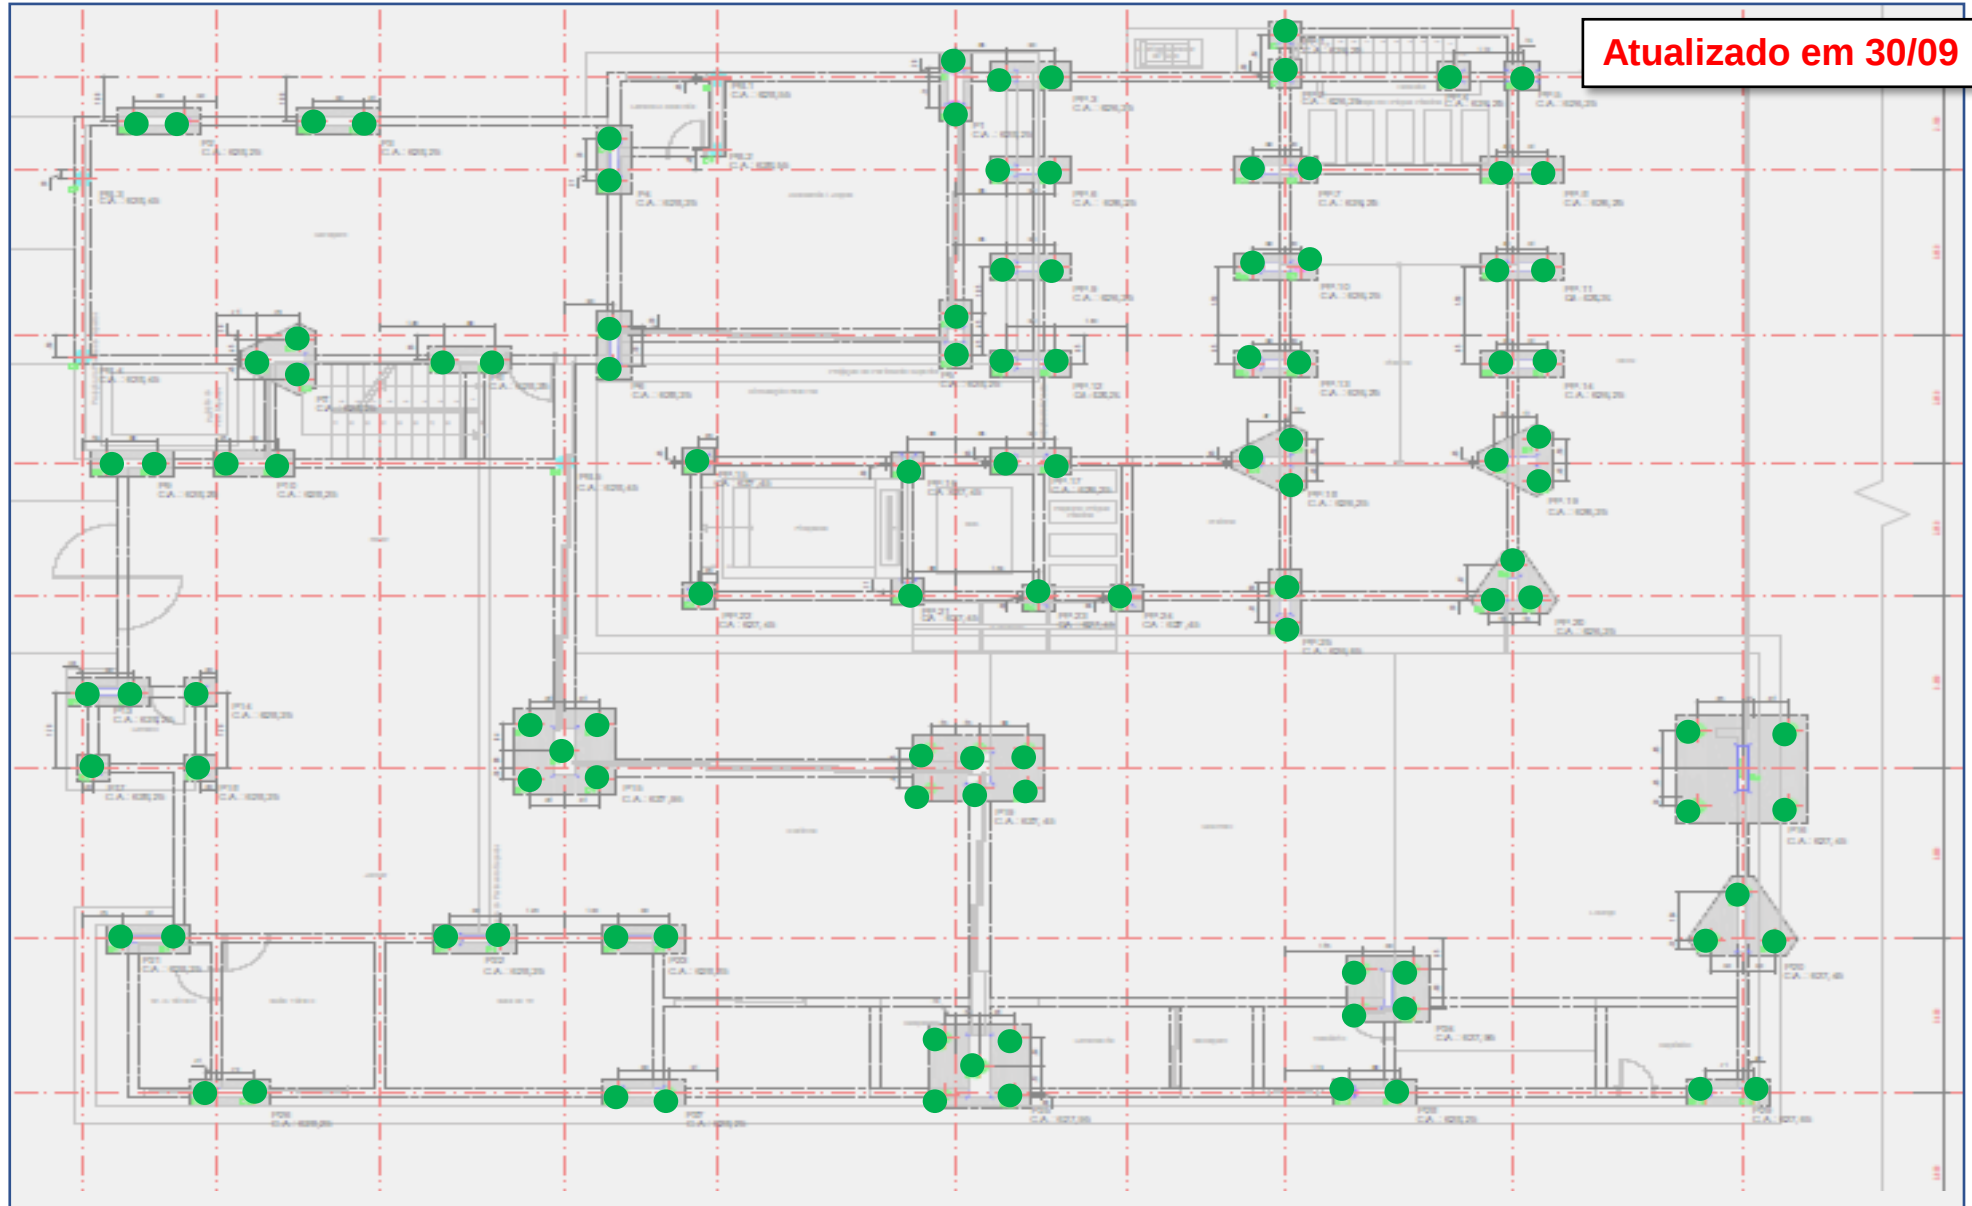



OBRA RESIDENCIAL DE ALTO PADRÃO

CRONOGRAMA
30/09/2025



CRONOGRAMA

Nome da tarefa ▾	Duração ▾	Início ▾	Término ▾	% Previst ▾	% Concluído Físico ▾
Obra residencial de alto padrão	329,13 dias	07/08/25	08/12/26	3,79	4,72
▶ MARCO	329,13 dias	07/08/25	08/12/26	11,55	99
▴ PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES	19,17 dias	08/08/25	04/09/25	100	100
▶ <i>PROJETOS</i>	<i>15,5 dias</i>	<i>08/08/25</i>	<i>29/08/25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
▶ <i>DOCUMENTOS DE INÍCIO DE OBRA</i>	<i>13,42 dias</i>	<i>18/08/25</i>	<i>04/09/25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
▴ CANTEIRO DE OBRAS	27,25 dias	07/08/25	15/09/25	100	100
▶ <i>TAPUME</i>	<i>15,63 dias</i>	<i>07/08/25</i>	<i>28/08/25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
▶ <i>CANTEIRO DE MADEIRA</i>	<i>16,63 dias</i>	<i>18/08/25</i>	<i>15/09/25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
▶ <i>LIGAÇÕES PROVISÓRIAS</i>	<i>6,88 dias</i>	<i>02/09/25</i>	<i>15/09/25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
▴ INFRAESTRUTURA	46,45 dias	07/08/25	13/10/25	62,9	91,68
▶ <i>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</i>	<i>15,63 dias</i>	<i>18/08/25</i>	<i>12/09/25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
▶ <i>SERVIÇOS PRELIMINARES</i>	<i>30,13 dias</i>	<i>07/08/25</i>	<i>26/09/25</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
▶ <i>FUNDAÇÃO PROFUNDA</i>	<i>14,32 dias</i>	<i>17/09/25</i>	<i>13/10/25</i>	<i>1,79</i>	<i>97,55</i>
▶ <i>MURO DE ARRIMO</i>	<i>2 dias</i>	<i>01/10/25</i>	<i>02/10/25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
▴ FUNDAÇÃO RASA	44,75 dias	13/10/25	17/12/25	0	0
▶ <i>BLOCOS</i>	<i>28 dias</i>	<i>13/10/25</i>	<i>17/12/25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
▶ <i>VIGAS BALDRAMES</i>	<i>28 dias</i>	<i>13/10/25</i>	<i>17/12/25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
▶ <i>ABRIGO DA CAIXA D'ÁGUA E CASA DE MÁQUINAS</i>	<i>31,75 dias</i>	<i>21/10/25</i>	<i>08/12/25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
▶ ESTRUTURA	118,68 dias	18/11/25	15/05/26	0	0
▶ ÁREA INTERNA	237 dias	18/12/25	08/12/26	0	0
▶ COBERTURA	138,25 dias	18/05/26	07/12/26	0	0
▶ ÁREA EXTERNA	271,05 dias	28/10/25	07/12/26	0	0



OBRA RESIDENCIAL DE ALTO PADRÃO

FOTOS DA OBRA
30/09/2025

FOTOS DA OBRA





FOTOS DA OBRA





